


변압기 점검기록표

2026년 05월 08일

상수 및 용량	전 압 (Kv/V)	제작 회사	제작 번호	외부 점검 양부	절연저항(MΩ)			*내 부 점 검				결과	비 고 (설치 장소)
					1차 대지	2차 대지	1차 2차	OT 내압시험	OT 산가도	유량	탭 위치		
3 Φ 1000kVA	22.9 350	(주) 효성		○	4000 이상	1080 이상	4000 이상	내부 점검 이상없음 (산가도 측정은 4년주기로 한다.)				양호	옥외

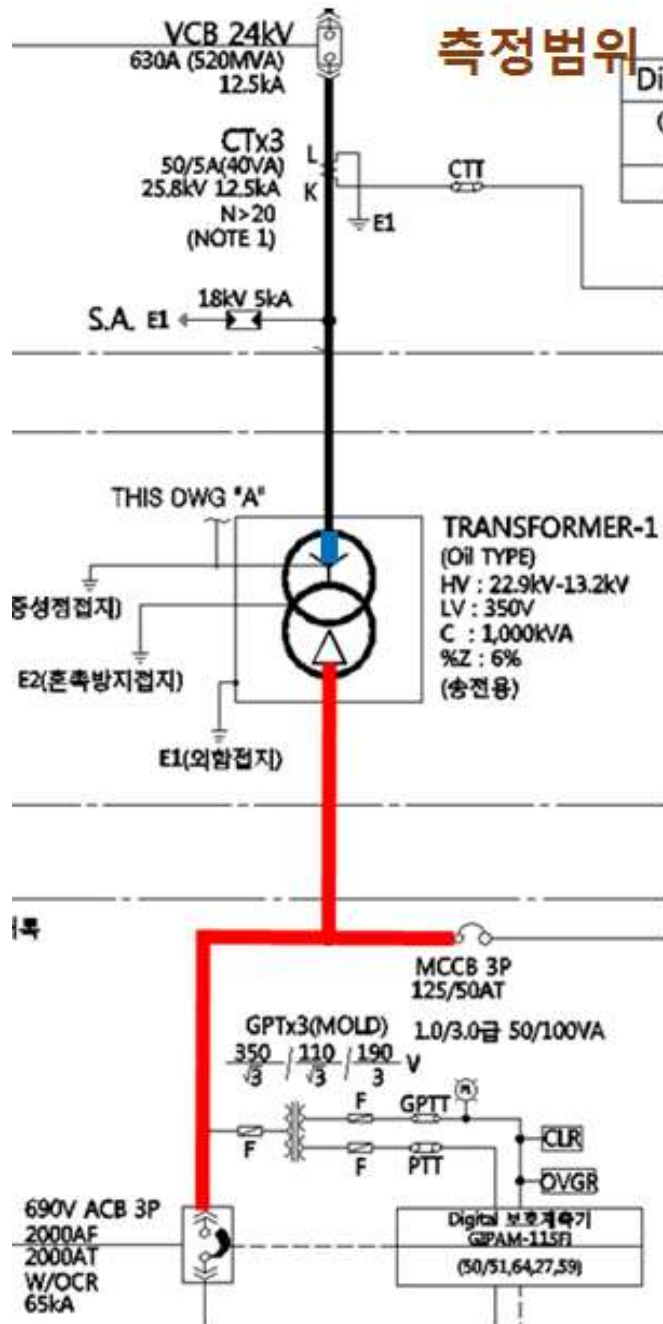

[비고] 1. *표 항목은 필요시에 실시함. 2. 외부 점검란은 ○,×로 표기
